

Comune di  
Alto Malcantone  
**Ufficio  
Tecnico**

Luogo e data

Lodevole  
Municipio di Alto Malcantone  
Ufficio tecnico  
6937 Breno

## Richiesta intervento su area pubblica

La domanda di apertura del cantiere (apertura campo stradale) deve essere presentata all'Ufficio tecnico comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori utilizzando il presente formulario.

Per eseguire i lavori richiesti su strada comunale l'istante deve possedere un'autorizzazione a costruire (licenza edilizia o altra autorizzazione rilasciata nell'ambito di procedure d'approvazione comunali). Per la posa sotto le strade comunali di infrastrutture che non necessitano di un'autorizzazione a costruire, l'istante deve comunque ottenere un'autorizzazione tecnica e di occupazione (rif. Richiesta occupazione area pubblica).

Oggetto

Mappale n°

Sezione

Indirizzo

CAP


Località

Licenza edilizia (RM)

Periodo d'intervento

Dal

Al



Comune di  
Alto Malcantone  
**Ufficio  
Tecnico**

## Contatti

Istante

Cognome persona di riferimento

Nome persona di riferimento

Indirizzo

NAP

Località

Telefono fisso

Telefono mobile

Progettista

Cognome persona di riferimento

Nome persona di riferimento

Indirizzo

NAP

Località

Telefono fisso

Telefono mobile

Direzione lavori

Cognome persona di riferimento

Nome persona di riferimento


Indirizzo

NAP

Località

Telefono fisso

Telefono mobile



Comune di  
Alto Malcantone  
**Ufficio  
Tecnico**

Impr. Costruzione

Cognome persona di riferimento

Nome persona di riferimento

Indirizzo

NAP

Località

Telefono fisso

Telefono mobile

**Allegati obbligatori:**


- Planimetria indicante la superficie manomessa prevista e relativi dettagli cantieristici (elenco macchinari utilizzati, entrata/uscita veicoli, depositi, ecc.). Formato A4/A3.
- L'istante o per lui l'esecutore dei lavori si impegna ad avisare i confinanti ai quali venga impedito l'accesso veicolare al proprio fondo. I lavori di scavo dovranno essere segnalati e protetti mediante la posa dei necessari cartelli e recinzioni a norma di legge.

Firma richiedente

Data, luogo

Firma

Con la firma del presente documento si accettano le condizioni di ripristino del sedime pubblico (pagine 4, 5 e 6).



## 1. Ripristino della carreggiata

### 1.1 Condizioni generali


Tutti i lavori di pavimentazione devono essere affidati a una ditta specializzata nella lavorazione delle pavimentazioni stradali. Il nome della ditta deve essere indicato nel presente formulario (pagina 2).

Salvo indicazioni contrarie dell'Ufficio tecnico comunale i ripristini sono eseguiti sempre in due fasi: nella prima fase lo strato bituminoso portante è posato provvisoriamente fino alla quota della pavimentazione esistente, nella seconda fase (8/12 mesi dopo il primo intervento) si fresa lo strato portante e si posa la pavimentazione di scorrimento.

### 1.2 Posa di infrastrutture longitudinali all'asse stradale

Di principio il nuovo manto di usura deve essere esteso ad almeno metà del campo stradale e più precisamente fra la delimitazione del ciglio e l'asse stradale. Non sono accettati rappezzi con superfici troppo piccole che non garantiscono un'ottima cilindratura della miscela o rappezzi che creano troppi giunti alla pavimentazione (Figura 1).

Esecuzione corretta

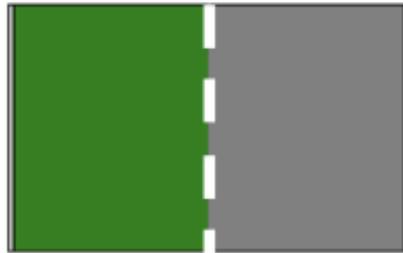

Esecuzione non ammessa


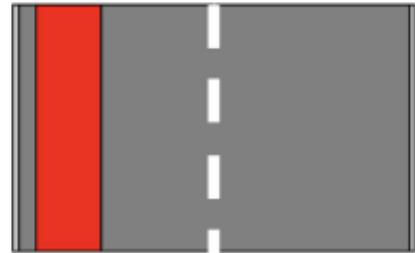


Figura 1

### 1.3 Posa di infrastrutture trasversali all'asse stradale

I tagli della pavimentazione devono essere effettuati il più possibile perpendicolari all'asse stradale. Qualora sia necessario eseguire più tagli ravvicinati il manto di usura deve essere esteso su tutto il campo stradale onde ottenere una superficie con un unico rappezzo (Figura 2).

Esecuzione corretta

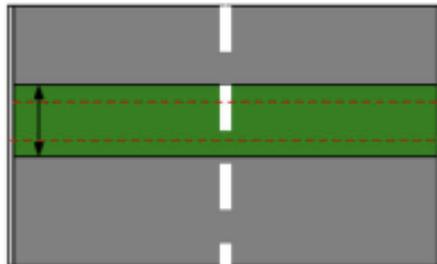

Esecuzione non ammessa

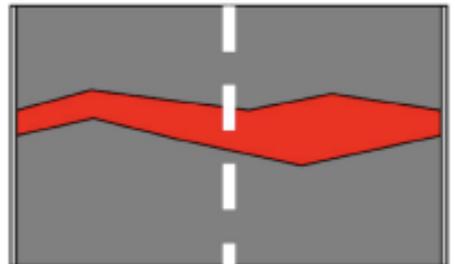


Figura 2



Comune di  
Alto Malcantone  
**Ufficio  
Tecnico**

## 2. Marciapiedi

### 2.1 Esecuzione

Tutti i lavori di pavimentazione devono essere affidati a una ditta specializzata nella lavorazione delle pavimentazioni stradali. Il nome della ditta deve essere indicato nel presente formulario (pagina 2).

Salvo indicazioni contrarie dell'Ufficio tecnico comunale i ripristini sono eseguiti sempre in due fasi: nella prima fase lo strato bituminoso portante è posato provvisoriamente fino alla quota della pavimentazione esistente, nella seconda fase (8/12 mesi dopo il primo intervento) si fresa lo strato portante e si posa la pavimentazione di scorrimento.



Figura 3

### 2.2 Esecuzione

Gli strati di pavimentazione sono determinati dal tipo di strada e dalla classe di traffico secondo la norma "SN VSS 640 430 Pavimentazioni bituminose – esecuzione".

Le sezioni standard per le strade comunali sono riprodotte nella tabella sottostante. Lo standard vale per tutti i ripristini indipendentemente dalla pavimentazione esistente prima dell'apertura dello scavo (Figura 4).

Dimensionamento strati di pavimentazione in funzione delle classi di traffico


TIPO DI STRADA	PISTE CICLABILI	MARCIAPIEDE	STRADE SECONDARIE TGM < 10'000		STRADE PRINCIPALI TGM ≥ 10'000		
Traffico ponderante equivalente giornaliero medio TF	< 30	< 30	> 30 ... 100	> 30 ... 100	> 100 ... 300	> 300 ... 1'000	> 1'000 ... 3'000
Classe di traffico	T1 molto leggero	T1 molto leggero	T2 (*) leggero	T2 leggero	T3 medio	T4 pesante	T5 molto pesante
Spessore totale pavimentazione	50 mm	65/70 mm	65 mm	100 mm	130 mm	170 mm	220 mm
Ripartizione degli strati di pavimentazione	AC 11	AC 8 AC T 10 variante AC 11	AC 8 AC T 10 variante AC 11 AC T 10	AC 8 AC T 22	AC 8 SDA 8 A (AC 11) AC T 22 (AC T 22)	AC 8 SDA 8 A (AC 11) AC 8 22 (AC 8 22) AC T 22 (AC T 22)	AC 8 SDA 8 A (AC 11) AC 8 22 (AC 8 22) AC T 22 (AC T 22)
Esigenze fondazione secondo SN 640 585	Pianura M11 ≥ 80 MN/m²			Pianura M11 ≥ 100 MN/m²			

Figura 4

## 3. Oneri a carico dell'autorizzato

### 3.1 Qualità dei materiali messi in opera

Le miscele bituminose e i misti granulari devono provenire da un impianto certificato e riconosciuto dal Cantone. L'Ufficio tecnico comunale può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione di dimostrare l'origine dei materiali e di consegnare le relative certificazioni.



### 3.2 Collaudo

Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'Ufficio tecnico comunale la fine dei lavori.

### 3.3 Prestazioni di garanzia

Il beneficiario dell'autorizzazione risponde verso il Comune delle prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori". Per il periodo di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118, in particolare si ricordano i seguenti articoli:

**art. 172** Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni.

**art. 180** I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un'opera (o di parte di essa). I diritti concernenti i difetti che l'imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni.

L'Ufficio tecnico comunale può chiedere al beneficiario dell'autorizzazione una garanzia per difetti (assicurazione bancaria = a favore del Comune di Alto Malcantone fino ad un valore massimo di Fr. 20'000.00.

### 3.4 Responsabilità

Il beneficiario dell'autorizzazione per lavori sulle strade comunali è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione al cantiere o alle opere da lui eseguite sulla proprietà del Comune di Alto Malcantone. In particolare egli assume per conto del Comune la responsabilità quale proprietario del fondo o dell'opera nell'ambito dei rapporti di vicinato (artt. 58 CO, 679 e 684 CCS). Egli risponde in ogni tempo per i danni risultanti da difetti nella conduzione del cantiere o nell'esecuzione dell'opera. Restano inoltre riservati i diritti dei terzi. In particolare, il Comune non risponde per eventuali danni provocati a tubazioni, cavi e altre infrastrutture esistenti. Il beneficiario deve essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

### 3.5 Documenti di riferimento e abbreviazioni

Leggi

- Legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01) LCStr
- Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21) OSStr
- Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (RS 832.311.141) OLCostr
- Legge cantonale sulle strade (7.2.1.2) LStr
- Legge edilizia (7.1.2.1) LE

Norme

- SIA 118 Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori
- SN VSS 640 420 Pavimentazioni bituminose – norma base
- SN VSS 640 430 Pavimentazione bituminose - esecuzione
- SN VSS 640 431 Pavimentazione bituminose - esigenze
- SN VSS 640 535 Lavori di scavo – prescrizioni per l'esecuzione
- SN VSS 640 538 Lavori di scavo – prescrizioni amministrative
- SN VSS 640 731 Manutenzione delle pavimentazioni – lavori di riparazione
- SN VSS 640 886 Segnaletica temporanea su strade e secondarie
- Prescrizioni INSAI concernenti la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro
